

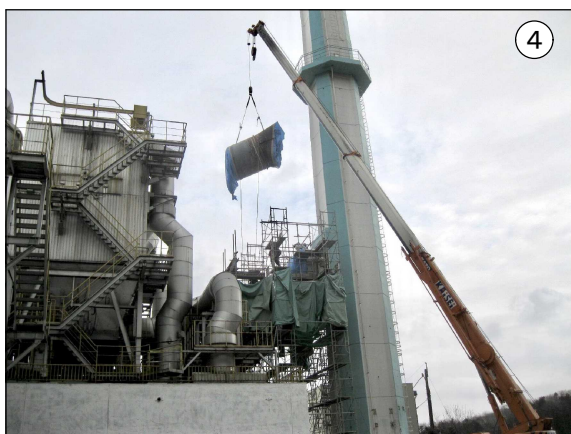
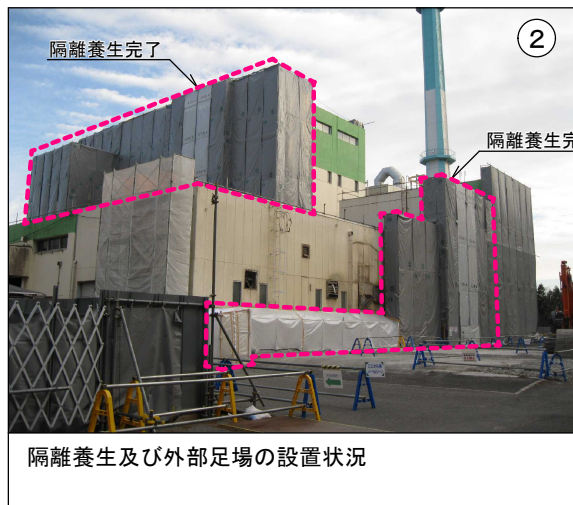
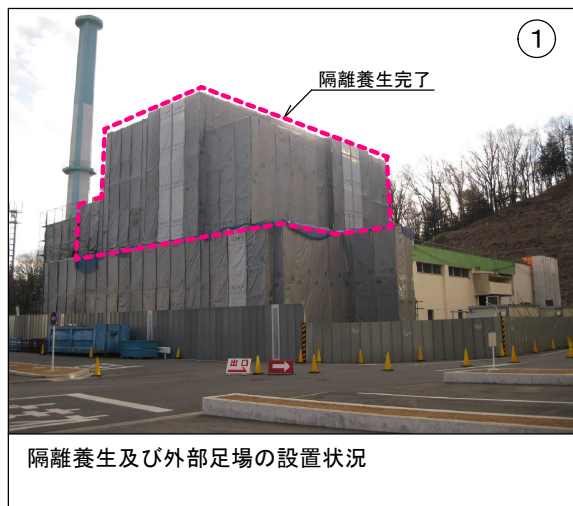


飯能市旧ごみ処理施設解体工事進捗状況（令和元年12月）

■アスベスト含有塗材の除去工事については、建物内部階段室等の除去が完了しました。引き続き、外壁部分の隔離養生の施工を行っていきます(画像①、②)。ダイオキシン類の除去工事については、外部設備機器をテント状の仮設構造物で覆い密閉養生空間にするため、床部分に止水コンクリートを打設しました(画像③)。その後、設備機器と煙突をつないでいた煙道の切り離しを行いました(画像④)。

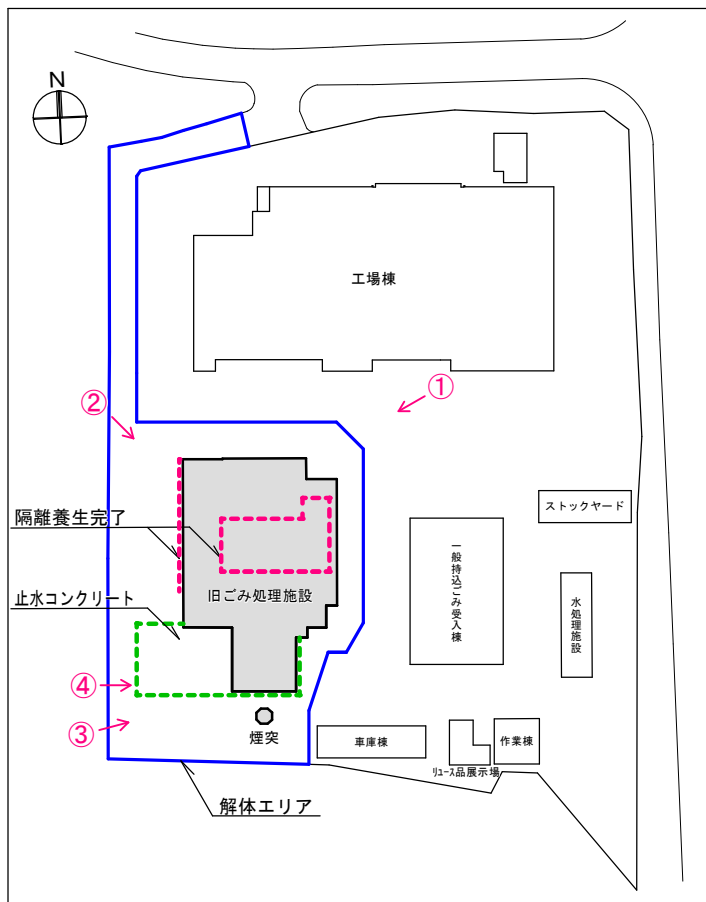

煙道の切り離しに際し、内部を負圧集じんしながら両端を切断し、完全密閉した後に吊り下ろしました。

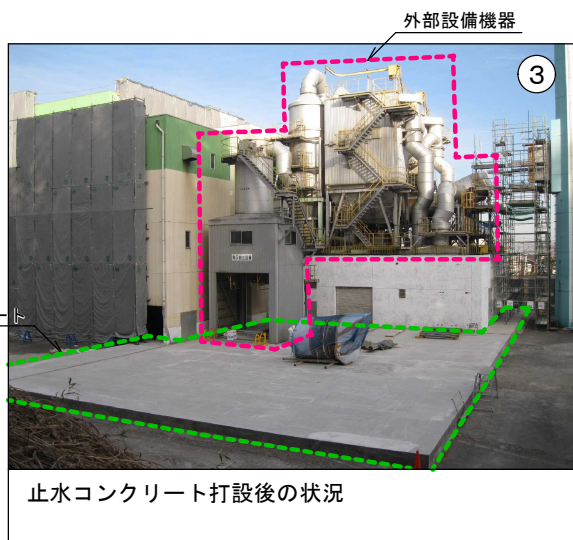

止水コンクリート
