


## 飯能市旧ごみ処理施設解体工事進捗状況（令和2年6月）

■ダイオキシン類の除去工事については、管理区域内の機器類及び付随する建物について解体しました（画像①、②）。今後は、アスベスト含有建材の残り1箇所について除去を行っていきます。

煙突部分については、内筒を高圧洗浄機にてダイオキシン類の除染を行いました（画像③、④）。

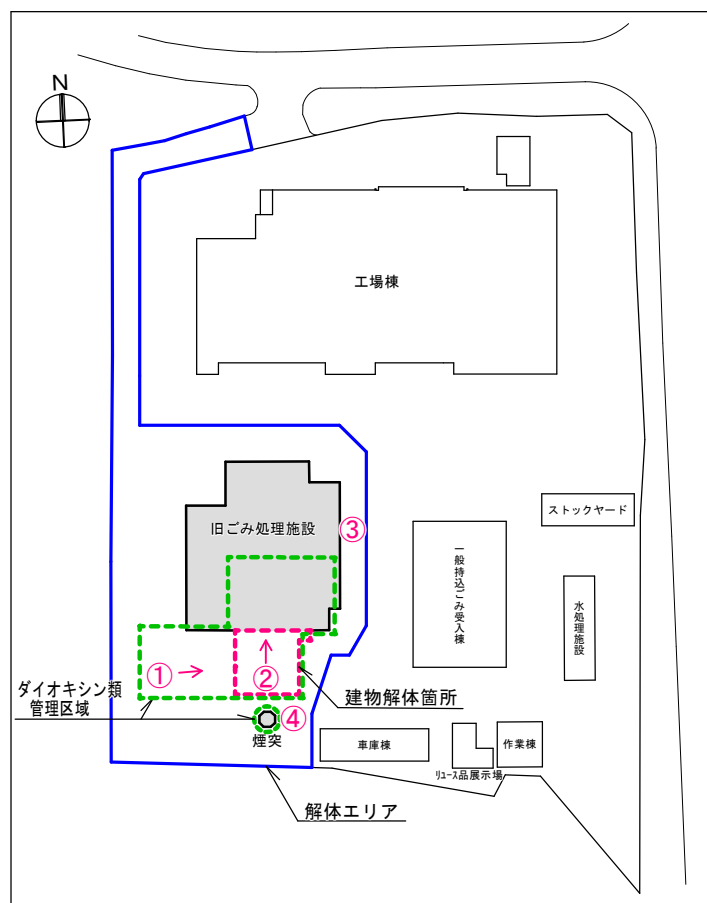

ダイオキシン類管理区域内の機器類及び付随する建物の撤去完了状況



ダイオキシン類管理区域内の機器類及び付随する建物の撤去完了状況



煙突内筒の除染状況（煙突最上部より高圧洗浄機を吊り下げて回転しながらの洗浄作業）



煙突内筒を除染するために使用する回転式高圧洗浄機（ノズルが2方向）
