

# 飯能市立飯能第一小学校等建替え 及び複合化に関する協議会

令和6年度

## 第2回 会議資料


令和7年3月24日

# 本日の会議の流れ

1. 令和6年度の検討内容の振り返りについて
2. 複合施設の建設に係る基本設計の概要について

# 令和6年度の振り返り

## 複合施設の建設に係る「基本設計」の策定

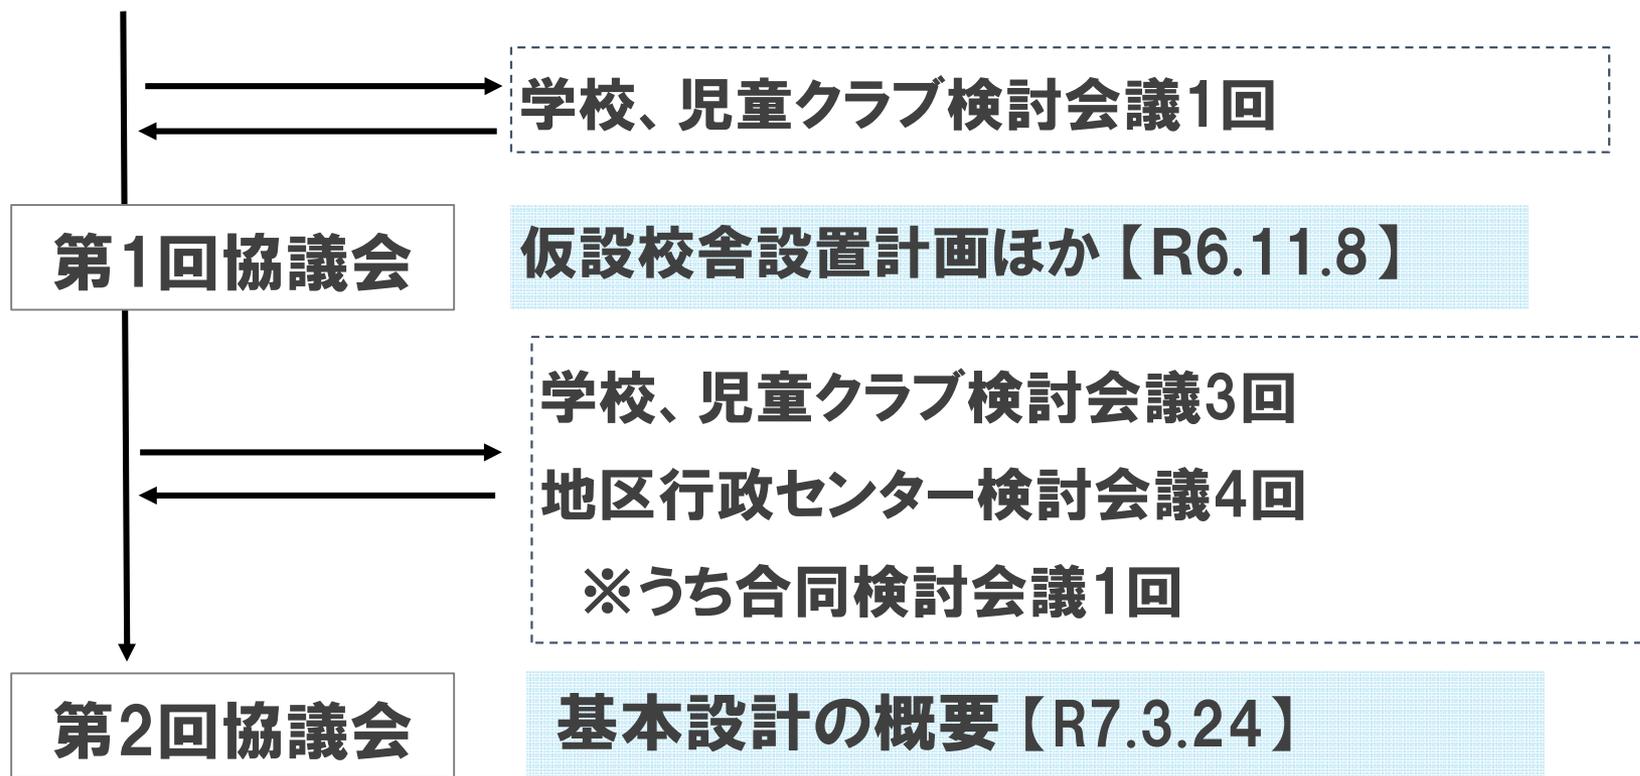

# 検討会議でのグループワーク

基本設計の策定にあたっては、**学校・児童クラブ検討会議**及び、**地区行政センター検討会議**の合同会議でグループワークを行い、外構計画、緑地計画、交流ひろばについてグループワークにより検討しました。



※ 令和7年1月24日に開催した合同検討会議でのワークショップの様子

- **複合施設の建設に係る「基本設計」の概要**

**別紙資料を参照。**

# 複合施設の建設に係る令和7年度の取組

## 複合施設の建設に係る「**実施設計**」の策定

令和6年度では、複合施設の建設に係る「基本設計」を、協議会での協議などを経て策定しました。

「基本設計」では、複合施設の配置計画図、平面計画図などを作成するとともに、工事期間中の仮設や建替えステップなどを検討しました。


令和7年度は、皆様の意見をいただき出来上がった「基本設計」を基に、より詳細な「実施設計」を策定します。



4. 平面・内部動線計画

**体育館等への動線の円滑化**  
 体育館での全校集会など、集中する西側への動線を分散させるため、3階から2階への動線を2方向確保します

**バリアフリーに配慮した学校**  
 体育館への動線のバリアフリーに考慮し学校側にもエレベーターを設置します

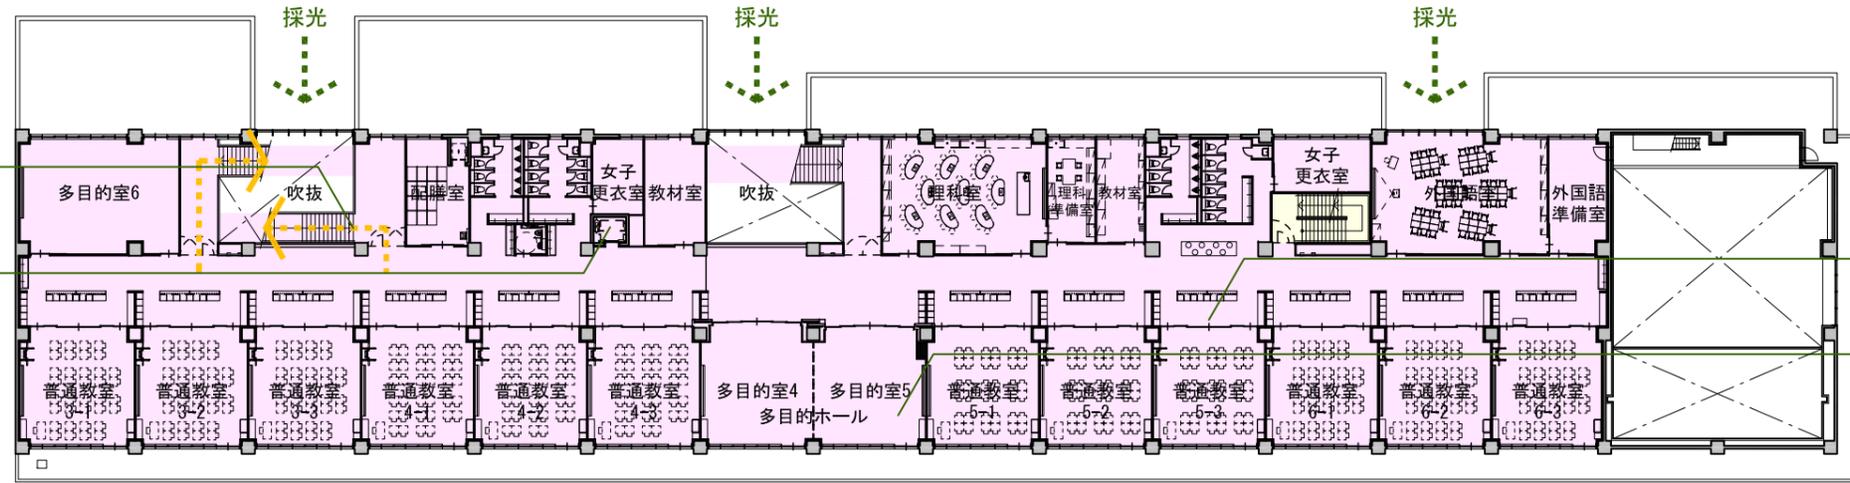


**教室を拡張するスペース**  
 教室前にロッカースペースを計画し多様化する教育に対応できる教室とします

**ホールとしても利用できる予備教室**  
 予備教室を兼ねた多目的室を連続させグループ学習の他、1学年が一同に集められる計画とします

3階 平面図

**学校の中心となるメディアセンター**  
 どの学年からもアクセスしやすい場所に図書と学習を合わせたメディアセンターを計画します

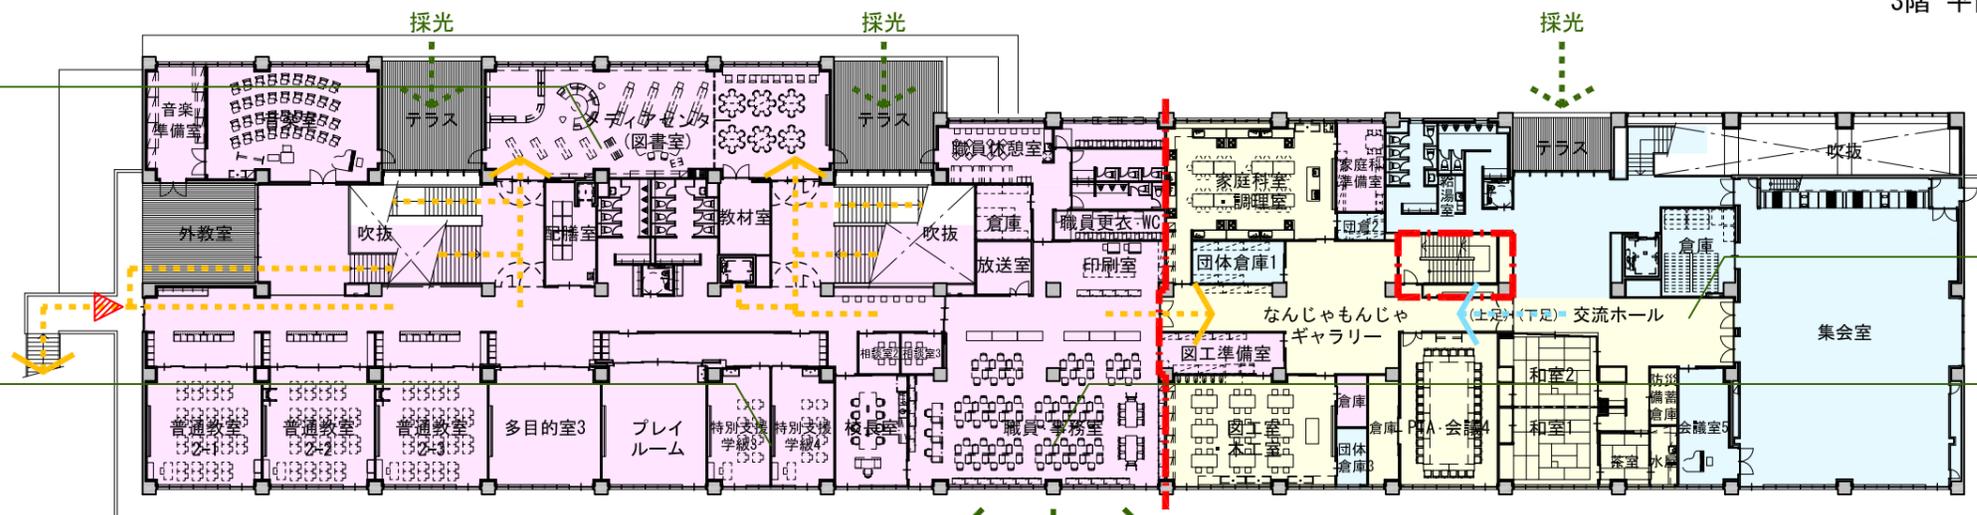


**学校と地域の共創空間**  
 共用するだけでなく協働や交流できる交流ホールを計画します

**インクルーシブ教育の環境の整備**  
 児童の成長に合わせ活動や交流の幅が広がるよう2階にも特別支援学級を計画します

**協働を支える教職員コモンズ**  
 地域連携やセキュリティラインの視認性向上のため、共用部に隣接して配置し、機能的で交流が促進される執務・作業空間とします

2階 平面図

**生徒を迎え交流の場となる階段状空間**  
 各階を吹抜けてつなぎ、日常的な交流を育む場、発表や集会の場とします

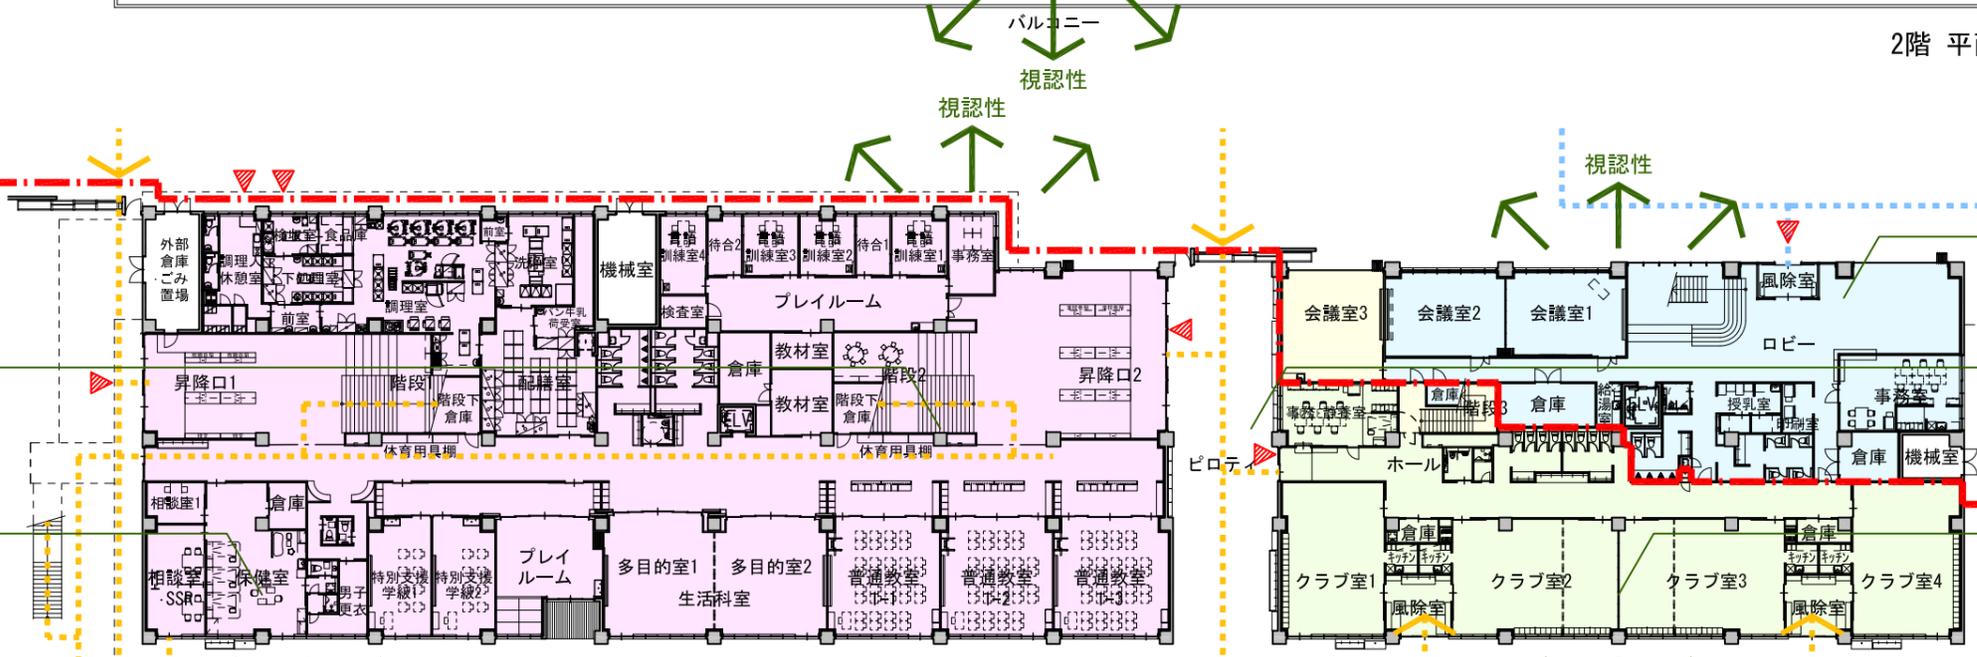

**地域コミュニティと連携する地区行政センター**  
 交流ひろばと連携・見守る位置に地区行政センターを配置します


**多様化する児童に寄り添うケアコモンズ**  
 校庭や既存体育館からも行きやすい位置に配置するとともに昇降口、特別支援学級に隣接させ多様化する児童への教育に対応可能にします

**多目的に利用できるみんなの道**  
 プロムナードから連続して半屋外スペースを設けさまざまな学習活動や雨天時の活動スペース災害時でも有効に活用できる計画とします

**おかえりと迎える放課後児童クラブ**  
 一度学校から出てピロティや軒下空間から出入りできる位置に児童クラブを配置します

既存体育館・プールへ

校庭への出入り



5. 事業計画

<事業スケジュール>

年度	R6			R7			R8			R9			R10			R11			R12								
	4	10	3	4	10	3	4	10	3	4	10	3	4	10	3	4	10	3	4	10	3						
発注																											
設計	複合施設基本設計			複合施設実施設計 既存建物解体実施設計									設計意図伝達・工事監理														
調査	敷地測量・地盤調査			アスベスト																							
申請				計画通知・条例届出																							
工事				仮設校舎設計・許可 1			仮設校舎建設 (6ヶ月) 2			既存南校舎解体 (7ヶ月) 2			仮設校舎利用期間 32ヶ月 複合施設建設 (18ヶ月) 3			仮設校舎解体 (3ヶ月) 4			既存北校舎解体 北側外構 (4ヶ月) 5			校庭整備 (6ヶ月) 5			既存行政センター解体 (8ヶ月)		
運用							●小学校仮設校舎引越し			小学校、放課後児童クラブ移転●			地区行政センター移転●														

<建替ステップ図>

