

令和7年度公共下水道工事第1工区(双南)

積算参考資料

[illegible]

共通仮設費の算定

工 種	算 出 根 拠	数 量
(3) 運搬距離		
1) 残土	施工箇所～東京活用土協同組合 (UCR) 青梅地区 東京都青梅市成木5-1390	12.4 km



2) As切断濁水処理 廃プラ	施工箇所～大丸商事(株) 狹山市広瀬台2-12-13	6.1 km
--------------------	-------------------------------	--------



3) Co, Asガラ	施工箇所～(株)丸宮	
	飯能市大字芦荻場字中原 4 7 5	3.0 km
		


VUφ200 素堀・施工日数及び工程表

素堀延長 137.40m

素堀H=1.5m ・バックホ 0.28m3級

種 算 出 根 拠	数 量
(1) 舗装切断	
484.6 m ÷ m/日 =	2.39 日
舗装版破碎	
568.1 m2 ÷ m2/日 =	1.18 日
機械掘削 バックホ 0.28m3	
174.0m3 ÷ m3/日 =	2.95 日
計	6.5 日
(2) 管布設 VUφ200	
135.8 m ÷ m/日 =	2.99 日
計	3.0 日
(3) A区分 タンパ	
43.0m3 ÷ m3/日 =	1.30 日
B区分 発生土 タンパ	
80.1m3 ÷ m3/日 =	2.43 日
計	3.7 日

工 程 表

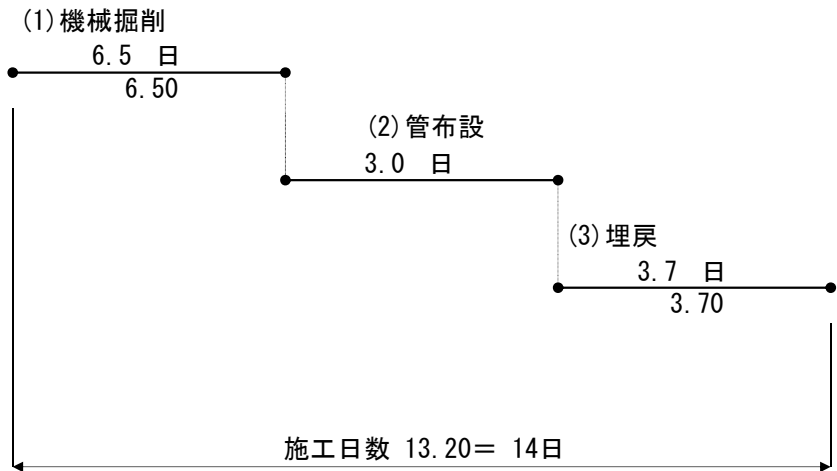

施工日数＝転用回数 14 回
 施工供用日数 14日 × 365/207＝ 25 日
 水替日数 0 日

誘導員計算

双南①

VUφ200	=	素掘り・施工日数及び工程表より			=	14 日
取付管工	=	12.2 m	÷	13.0 m/日	=	0.94 日 (2箇所)
道路復旧工	不陸整生 =	434 m ²	÷	1510 m ² /日・層 × 1 層分	=	0.29 日
道路復旧工	不陸整生 =	9 m ²	÷	1510 m ² /日・層 × 1 層分	=	0.01 日
道路復旧工	フィルター層 =	4 m ²	÷	280 m ² /日・層 × 1 層分	=	0.01 日 (10cm)
道路復旧工	下層路盤(車道)=	122 m ²	÷	940 m ² /日・層 × 1 層分	=	0.13 日 (15cm)
道路復旧工	下層路盤(歩道)=	4 m ²	÷	268 m ² /日・層 × 1 層分	=	0.01 日 (10cm)
道路復旧工	上層路盤(車道)=	122 m ²	÷	940 m ² /日・層 × 2 層分	=	0.26 日 (17cm)
道路復旧工	表層(車道) =	434 m ²	÷	1300 m ² /日・層 × 1 層分	=	0.33 日 (5cm)
道路復旧工	表層(車道) =	122 m ²	÷	250 m ² /日・層 × 1 層分	=	0.49 日 (3cm)
道路復旧工	表層(歩道) =	9 m ²	÷	600 m ² /日・層 × 1 層分	=	0.02 日 (4cm)透水As
道路復旧工	表層(歩道) =	4 m ²	÷	250 m ² /日・層 × 1 層分	=	0.02 日 (4cm)

小計 16.5 日

まるめ 17 日

交通誘導警備員B 3 人 + 交代要員 1 人 = 68 人
